


F)

Plan de Trabajos y Curvas


ARQ. PEREZ RICARDO
BRICONS SAICFI


Mariana Marquez
Inspección de Obra
Ministerio de Transporte de la Nación


BRICONS S.A.I.C.F.I.
Arq. JORGE D. RASPAGLIESI
REPRESENTANTE TECNICO

IF-2017-19268351-APN-DNS#MTR

G.C.A.B.A. - MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

OBRA : "METROBUS RUTA 8"

BED 1 - MODIFICACIONES DE PROYECTO

PLAN DE TRABAJOS


ITEM	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	%						
				4	5	6	7	8	8
				abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17
	OBRA BASICA + BED								
1	TRABAJOS PRELIMINARES	6.426.850,90	5,07%	6,00%	8,00%	10,00%	18,00%	20,00%	38,00%
2	MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES	2.965.005,20	2,34%			10,00%	15,00%	20,00%	55,00%
3	DE HORMIGON ARMADO	22.754.679,53	17,96%		7,20%	11,70%	15,00%	15,00%	51,10%
4	ESTRUCTURA METALICA	17.514.544,39	13,83%				15,00%	20,00%	65,00%
5	CUBIERTA	5.823.964,81	4,60%				15,00%	20,00%	65,00%
6	INSTALACION ELECTRICA	10.861.146,15	8,57%				15,00%	15,00%	70,00%
7	PISOS Y PAVIMENTOS	4.661.342,50	3,68%				15,00%	19,00%	66,00%
8	CARPINTERIA METALICA	6.336.698,96	5,00%				15,00%	18,00%	67,00%
9	VIDRIOS	6.459.577,92	5,10%						100,00%
10	EQUIPAMIENTO	1.749.100,34	1,38%					10,00%	90,00%
11	EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD VIAL	15.440.356,20	12,19%						100,00%
12	CANTEROS PREMOLDEADOS	12.796.737,19	10,10%						100,00%
13	VEGETACION	8.633.622,56	6,82%						100,00%
14	GRAFICA	346.331,34	0,27%						100,00%
15	VARIOS	3.901.878,68	3,08%	6,00%	7,00%	10,00%	10,00%	28,00%	39,00%
	TOTAL BASICO + BED	126.671.836,67							
	TOTAL OBRA	126.671.836,67	100%						
	AVANCE FISICO MENSUAL			0,488%	1,923%	3,156%	9,679%	11,75%	73,01%
	AVANCE FISICO ACUMULADO			0,49%	2,41%	5,57%	15,25%	26,99%	100,00%
	INVERSION MENSUAL			\$ 618.116,44	\$ 2.435.815,80	\$ 3.997.327,02	\$ 12.260.158,20	\$ 14.882.143,86	\$ 92.478.275,35
	INVERSION ACUMULADA			\$ 618.116,44	\$ 3.053.932,24	\$ 7.051.259,26	\$ 19.311.417,46	\$ 34.193.561,32	\$ 126.671.836,67

Arq. JOSE LUIS PASPAQUETTI
PERMISITARIO TECNICO

ARQ. PASCARICARDO
BPH

Mano Márquez
Intendencia de Obra
Ministerio de Transporte de la Nación

CURVA DE INVERSIÓN
OBRA: METROBUS RUTA 8
BED 1 - MODIFICACIONES DE PROYECTO

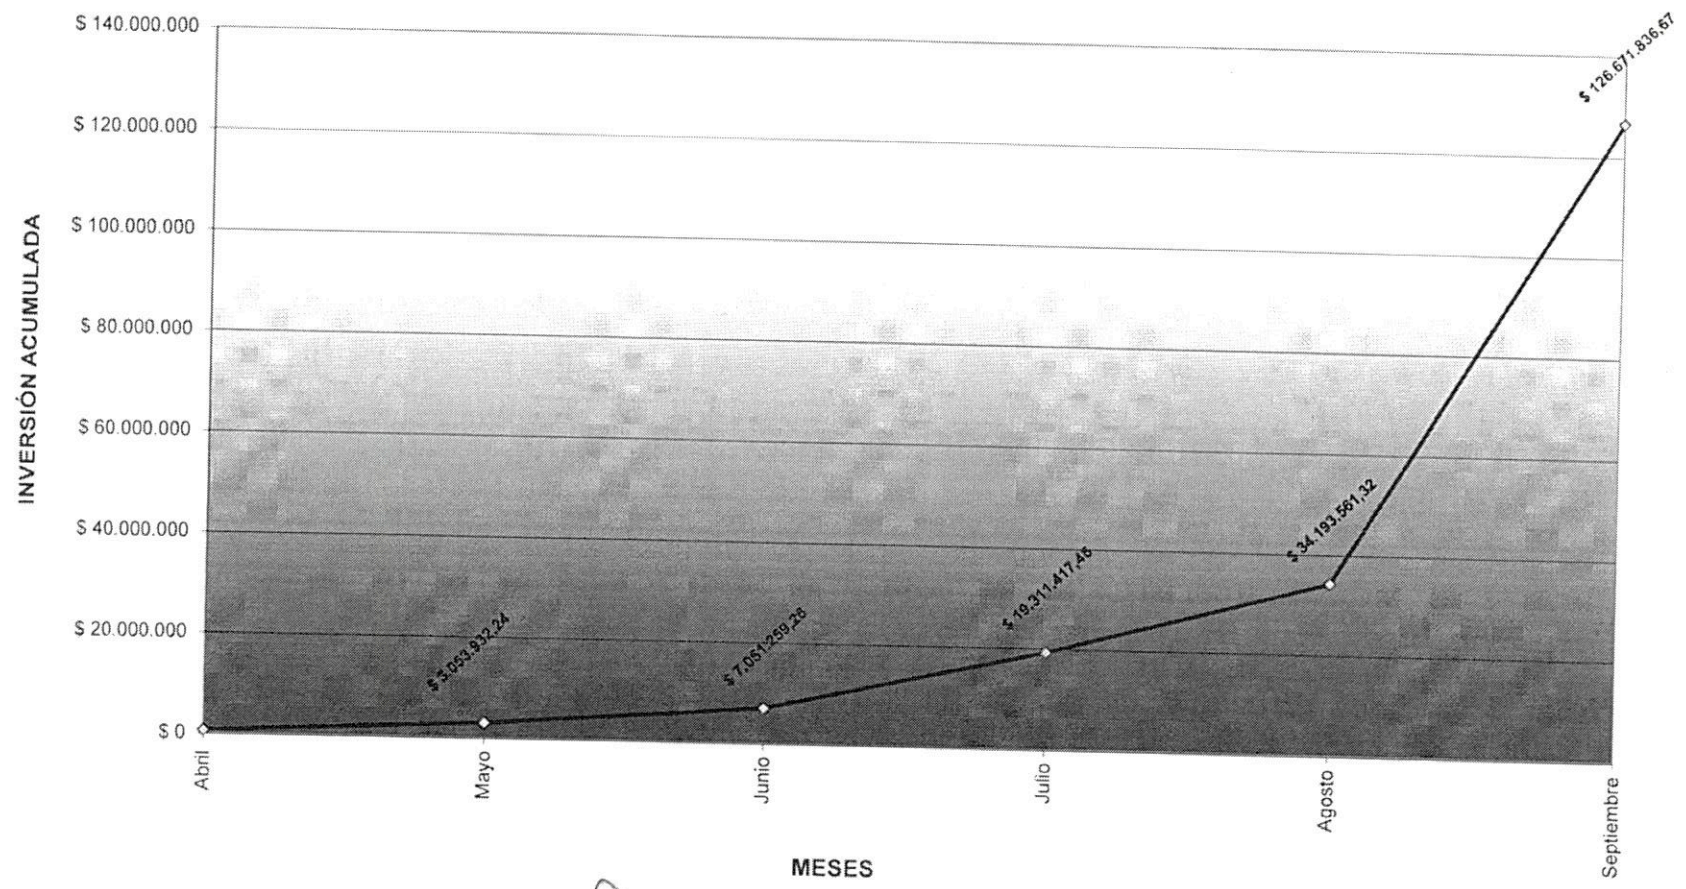


[Signature]
ARQ. PEREZ RICARDO
BRICONS SAICFI

[Signature]
Mariño Márquez
 Inspección de Obra
 Ministerio de Transporte de la Nación

[Signature]
BRICONS SA
ARQ. JORGE D. RASPAGLIESI
 REPRESENTANTE TECNICO

BRICONS SAICFI
Arq. JORGE D. RASPAIGLIESI
REPRESENTANTE TÉCNICO

CURVA DE AVANCE FÍSICO OBRA: METROBUS RUTA 8 BED 1 - MODIFICACIONES DE PROYECTO

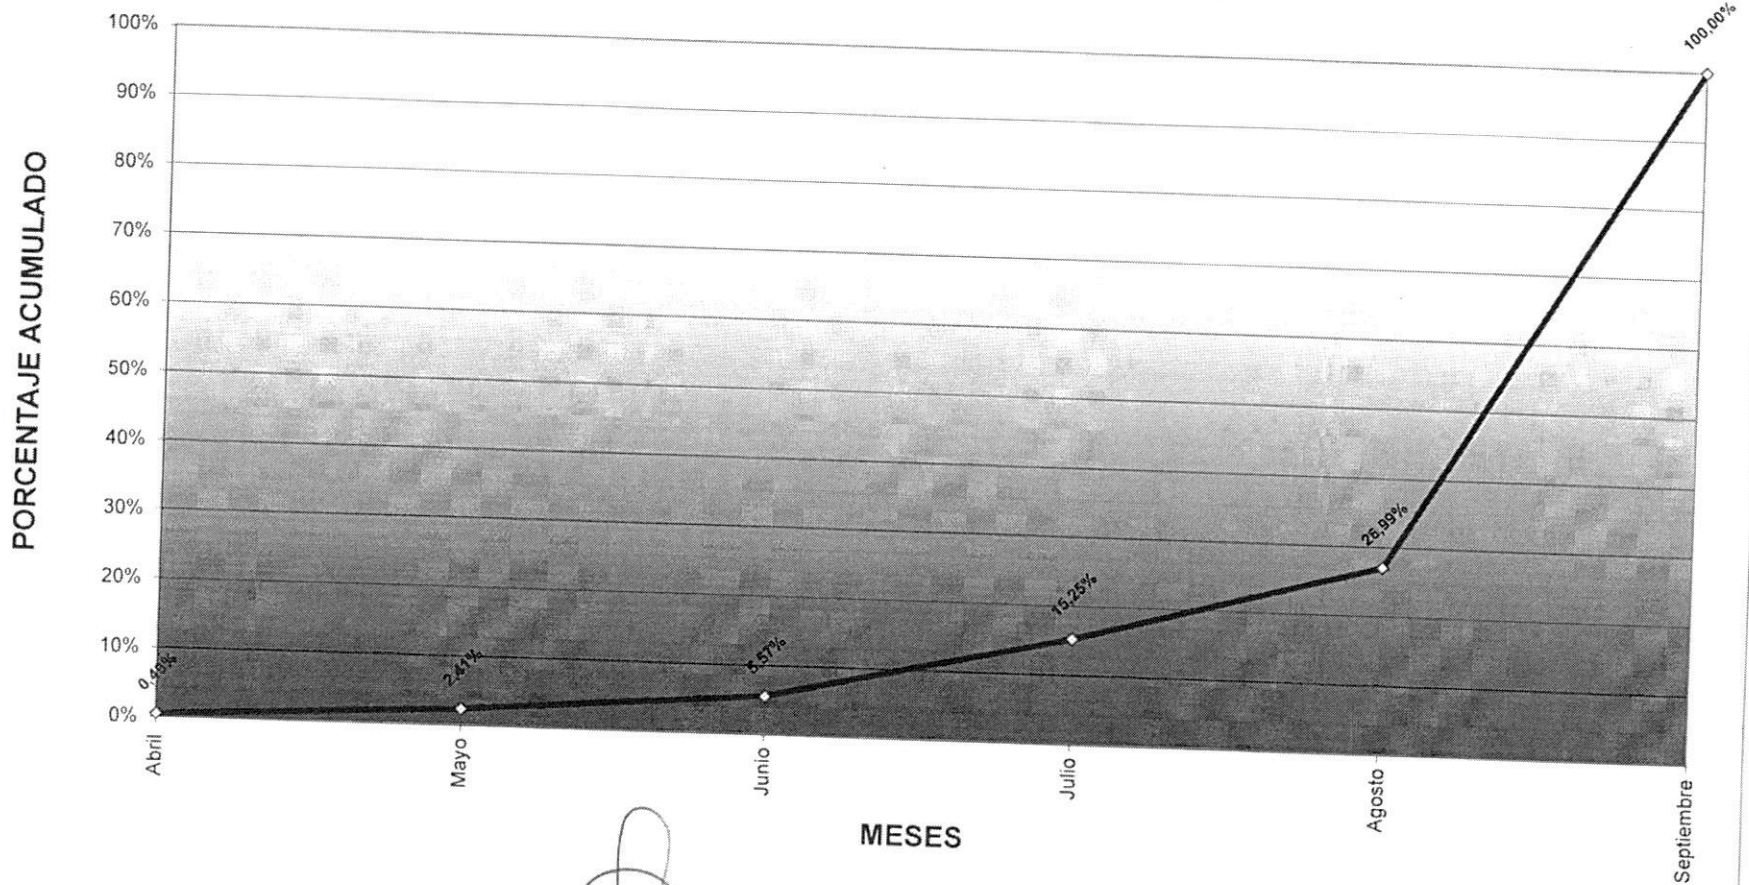

ARQ. PEREZ RICARDO
BRICONS SAICFI

Manuel Márquez
Inspección de Obra
Ministerio de Transporte de la Nación
