

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA



OBRA BASICA Y CASA POSADAS

ITEM	SECTOR	TAREA	Año 2018		B AGOSTO - DICIEMBRE - 18		C OCTUBRE - D NOVIEMBRE - 18		Dic-18		Ene-17	
			M1	M2	M1	87	M1	811	M1	318		
1	OBRA BASICA											
1,2		EQUIPAMIENTO ENTREGA INMEDIATA										
		EQUIPAMIENTO ENTREGA INTERMEDIA										
		EQUIPAMIENTO ENTREGA TARDÍA										
1,3		MONTAJE ASC 10, 11 Y 12										
1,4		MONTAJE ASC 17, 18 Y 19										
		HABILITACIONES ASCENSORES										
2	CASA POSADAS											
2,2		OBRA CIVIL										
2,3		EQUIPAMIENTO										
2,4		MUEBLES FIJOS										
2,5		CORTE PROGRAMADO DE SUMINISTRO ELECTRICO PARA LA CONEXION DEFINITIVA DE CASA POSADAS.										
2,6		INSTALACION SANITARIA										
2,7		INSTALACION AIRE ACONDICIONADO										
2,8		PARCUIZACION Y RIEGO										
2,9		PUERTA EN MACHA Y PRUEBA DE EQUIPOS										
2,1		INSTRUCTIVOS DE MANTENIMIENTO										
2,11		ASCENSOR										
2,12		HABILITACIONES										

Obrs Básicas	\$ 8.100,88
ADICIONAL 3	\$ 4.434.873,77
	\$ 4.443.074,65


CERTIFICACION MENSUAL	\$ 1.777.469,77	\$ 1.333.102,33	\$ 888.734,88	\$ 444.367,44
CERTIFICACION ACUMULADA	\$ 1.777.469,77	\$ 3.110.572,10	\$ 3.099.306,88	\$ 4.443.874,42

*Teodoro J. Argerich*  
CAPUTO S.A.I.C.y F.  
Ing. TEODORO J. ARGERICH  
APODERADO

OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PLAN DIRECTOR 1º ETAPA HOSPITAL DR. ALEJANDRO POSADAS

Ubicación - Avda. Arturo Illia S/Nº y Marconi de la Localidad del Palomar

### INVERSION ACUMULADA REAL Y PLAZO

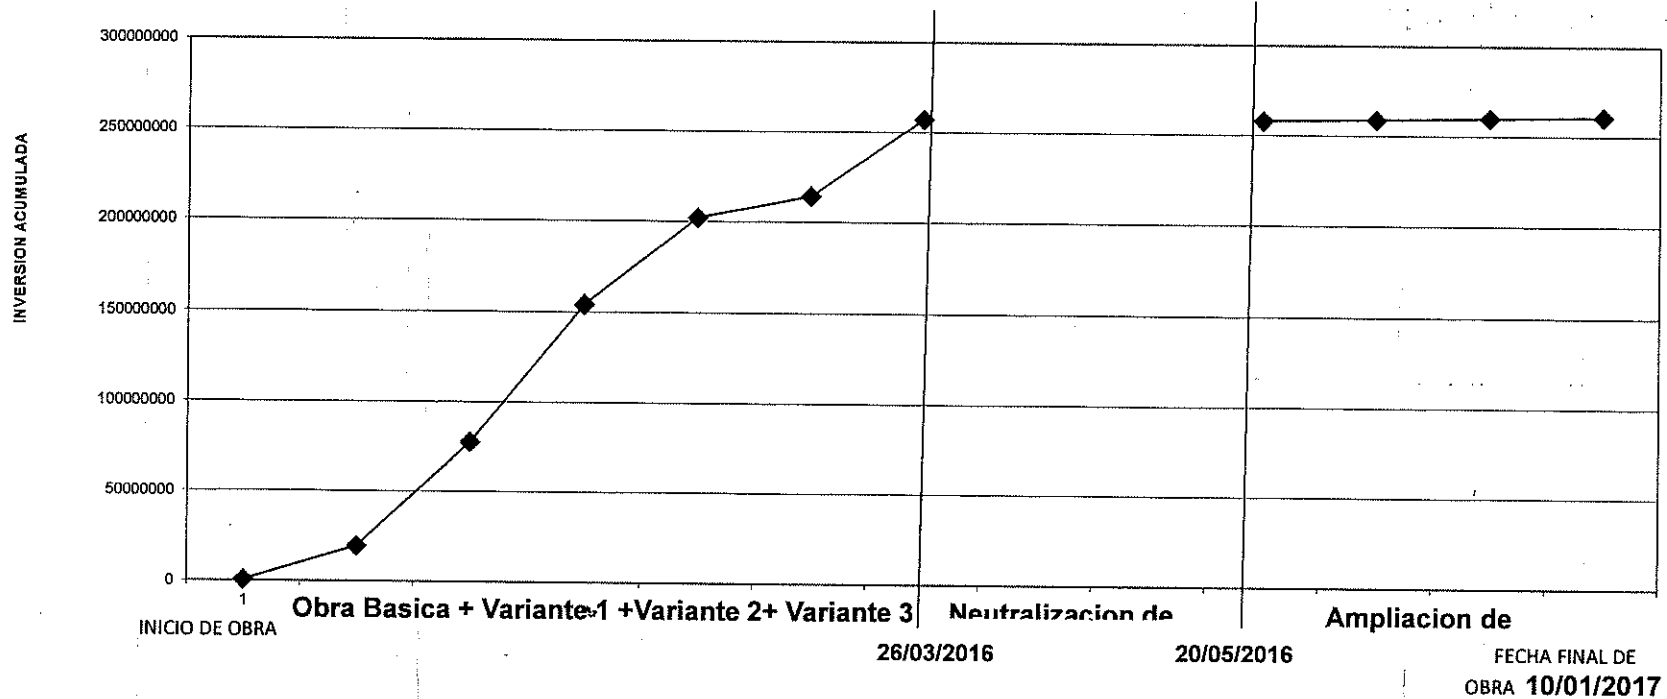

*[Handwritten Signature]*  
CAPUTO S.A.T.C.y F.  
Ing. TEODORO J. ARGERICH  
APODERADO
