


22/9/2021 27/9/2021 4/10/2021 11/10/2021 18/10/2021 25/10/2021 1/11/2021 8/11/2021 15/11/2021 22/11/2021 29/11/2021 6/12/2021 13/12/2021 20/12/2021 27/12/2021 3/1/2022 10/1/2022 17/1/2022 24/1/2022 31/1/2022 7/2/2022 14/2/2022 21/2/2022 28/2/2022 7/3/2022 14/3/2022 21/3/2022 28/3/2022 4/4/2022 11/4/2022 18/4/2022 25/4/2022 2/5/2022 9/5/2022 16/5/2022 23/5/2022 30/5/2022 6/6/2022 13/6/2022 20/6/2022 27/6/2022 4/7/2022 11/7/2022 18/7/2022 25/7/2022 1/8/2022 8/8/2022 15/8/2022 22/8/2022 29/8/2022 5/9/2022 12/9/2022 19/9/2022 26/9/2022 3/10/2022 10/10/2022 17/10/2022 24/10/2022 31/10/2022 7/11/2022 14/11/2022 21/11/2022 28/11/2022 5/12/2022 12/12/2022 19/12/2022 26/12/2022 2/1/2023 9/1/2023 16/1/2023 23/1/2023 30/1/2023 6/2/2023 13/2/2023 20/2/2023 27/2/2023 6/3/2023 13/3/2023 20/3/2023


Hitos 13 y 14 (63 semanas) Sem 8 a Sem 71

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

**CORE** Fabricación e importación de equipos  
 Firma de Contrato de CORE  
 Homologación de Equipos  
 Planificación Técnica  
 Plan de Migración  
 Relevamiento de Sitios  
 Ingenierías  
 Instalación de Equipos  
 Preparación de MOP y LLD  
 Replanteo de Ingenierías  
 Migraciones Físicas & Aceptación  
 Entrega de Conforme a Obra

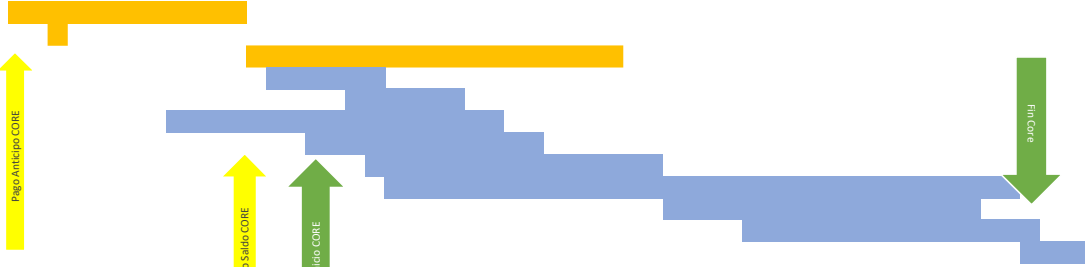

**AGG** Impo y entrega de equipos  
 Homologación de Equipos  
 Planificación Técnica  
 Plan de Migración  
 Relevamiento de Sitios  
 Ingenierías  
 Preparación de MOP y LLD  
 Instalación de Equipos & Migración  
 Entrega de Conforme a Obra

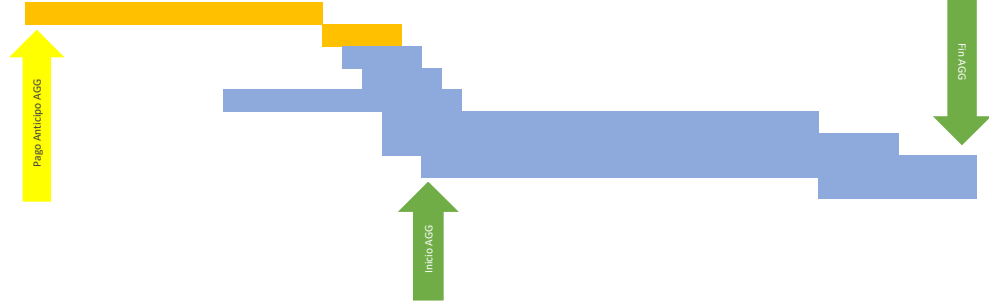



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** Cronograma

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.
